



KONTROLLI I LARTË I SHTETIT

Raport Përfundimtar për auditimin e ushtruar në Autoritetin Rrugor Shqiptar për Projektin “Ndërtim i rrugës Qukës – Qafë Plloçe”.

**RAPORT PËRFUNDIMTAR AUDITIMI
PËRPUTHSHMËRIE
NË
AUTORITETIN RRUGOR SHIPTAR
Projekti “Ndërtim i rrugës Qukës-Qafë Plloçe”**

DREJTORIA E RAJONIT QENDROR TIRANE

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Drejtoria e Rajonit Qendror Tirane
Adresa Rr.Princ Vidi nr .18/3 Tiranë
Tel/Fax 0692096702 dhe +35542356188
E-mail drqtirane.arrsh@arrsh.gov.al
Faqja në Internet www.arrsh.gov.al

2. Lloji i procedurës: “*Procedurë e Hapur – Shërbime* ”

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 <https://www.app.gov.al> 412/546

Buletini Nr. 38 datë 24 Shtator 2018

Agjencia e Prokurimit Publik

3. Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër : Mirëmbajtje me performancë Librazhd - Togëz, Togëz - Zgosht, Zgosht - k/Borovë, k/Borovë - Steblevë, K/Rr. Nac. Nr.3 (Urakë) - Golik, K/Rr. Nac. Nr.3 (Hotolisht) - Frarë, Qukës – (Karkavec) Qafë Plloçë Loti 1 (49.95 km) (Kontrata 7)

4. Numri i referencës së procedurës/lotit REF-73683-06-06-2018

5. Fondi limit 25.418.467 leke (pa T.V.SH)

6. Vlera totale përfundimtare e kontratës (*duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimit*):

29.276.337 (me TVSH)

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha

7. Data e lidhjes së kontratës 17.09.2018

8. Emri dhe adresa e kontraktorit / nenkontraktorit

Emri BAJRAMI N shpk
Adresa Rruga nacionale Xibrake –Elbasan km 13, kantieri me numer pasurie 73411
Nr. NIPT K027272020



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Nr. _____ Prot.

Tiranë, më ____ . ____ . 2020

**FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM
NË MARRËVESHJEN KUADËR**

[16.11.2020]

OPERATORIT EKONOMIKË “CURRI”

Tirane Njesia Administrative Nr.10, Rruga Kajo Karafili, Nd.2, H.4, Ap.3, 1001

Procedura e prokurimit: “Procedurë e Kufizuar-Sherbim /Marveshje kuader) me disa operatore ekonomik(nje fitues per çdo Lot) me objekt “ Mirëmbajtje me performancë të rrugëve Rajoni Qendror“ (e ndare ne 2 Lote), me fond limit te marveshjes kuader me 148.823.123 (njqind e dyzete e tete milion e teteqind e njezete e tre mije e njqind e njezete e tre) Lekë pa TVSH, financuar nga Buxheti i Shtetit per Drejtorine e Rajonin Qëndror, Tiranë , REF-71904-09-15-2020

Numri i referencës së procedurës/lotit: Loti VIII : REF-71907-09-15-2020

Përshkrim i shkurtër i kontratës: VIII: “Mirëmbajtje me performancë Librazhd - Steblevë, Urakë - Golik, Hotolisht - Frarë, Qukës – Qafë Plloçë Loti 1 ” me fond limit 148.823.123 (njqind e dyzete e tete milion e teteqind e njezete e tre mije e njqind e njezete e tre) lekë me tvsh, Afati kohor duke filluar nga data e lidhjes se kontrates/kontratave sipas kerkesave te Autoritetit Kontraktor, brenda 48 muajve te neneshkrimit te Marveshjes Kuader.

Publikime të mëparshme : Buletini i Njoftimeve të datës 21 Shtator 2020 [Nr.74]

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: oferta ekonomikisht më e favorshme X



DREJTORIA E RAJONIT QËNDROR TIRANË

1. Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri Drejtoria e Rajonit Qëndror Tiranë
Adresa Rruga Princ Vidi nr. 18/3 Tiranë.
Tel/Fax -
E-mail drqtiranë.arrsh@arrsh.gov.al
Faqja në Internet www.arrsh.gov.al/ Drejtorite Rajonale

2. Lloji i procedurës së prokurimit: “E Kufizuar , mbi kufirin e lartë monetar” Prokurim i Perqendruar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar ;

Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër: Loti VIII. objekt : “Mirëmbajtje me performancë Librazhd - Steblevë, Urakë - Golik, Hotolisht - Frarë, Qukës – Qafë Pllaçë”

3. Numri i referencës së procedurës/lotit Loti VIII: REF-71907-09-15-2020

4. Fondi limit / marrëveshje kuader me afat 4 vjecar per lotin VIII: 148,823,123 (njëqind e dyzetë e tetë milion e tetëqind e njëzet e tre mijë e njëqind e njëzet e tre) lekë pa tvsh;

5. Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nenkontraktimin):

Vlera totale per 4 vitet e marrv. kuader 2020-2024	178,309,945.92 leke (njëqind e shtatëdhjetë e tetë million e treqind e nëntë mijë e nëntëqind e dyzet e pesë presje nëntëdhjetë e dy)lekë me Tvsh	Monedha	leke
Vlera per periudhen	47,044,138 (dyzet e shtatë milion e	Monedha	leke

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510 <https://www.app.gov.al> 255/473

Buletini Nr. 26 datë 22 Shkurt 2021

Agjencia e Prokurimit Publik

11.12.2020-31.12.2021 dyzet e katër mijë e njëqind e tridhjetë e tetë) leke me TVSH

Vlera e nenkontraktimit _____ me Tvsh Monedha _____;

6. Data e lidhjes së kontratës: 11.12.2020; Fillimi i zbatimit 11.12.2020.

Kontraktori: “CURRI”, shpk, me administrator Z. Faik Curri , Nr NIPTI J67902718S, me adresë: Rruga Kajo Karafili Nd 2, H4, Ap.3, Njësia administrative Nr.10, 1001, Tiranë.

3.3 Numri i ofertave të dorëzuara: 7

Numri i ofertave të rregullta: 4

Seksioni 4 Informacion rreth kontratës:

4.1 Numri i Kontratës: 135/2 prot, Data e Kontratës: 11/03/2025

4.2 Emri dhe adresa e kontraktorit:

Emri "ALBAVIA" SHPK

Adresa TIRANE Rruga Sulejman Delvina, Pallati Fati, shk. 1, ap. 19

Nipti J81527001Q

Tel/Fax 0697071451

E-mail : info@albavia.al

Ueb-faqe _____

4.2.1 Emri dhe adresa e nënkontraktorit/eve

Emri _____

Adresa _____

Nipti _____

Tel/Faks _____

E-mail _____

Ueb-faqe _____

4.3 Vlera totale përfundimtare e kontratës (duke përfshirë lotet opsionet dhe nënkontraktimin):

Vlera 246,238,366.50 (pa TVSH) Monedha lekë

Vlera 295,486,039.80 (me TVSH) Monedha lekë

4.3.1 Vlera totale e nënkontraktimit :

Vlera _____ (pa TVSH) Monedha _____

Vlera _____ (me TVSH) Monedha _____



AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR

Drejtuar: OE "2 T"
Nipti: K01731001M
TIRANE Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5

- OE/BOE me nënkontraktor
PO JO X

-OE/BOE me Subjekt Mbështetës:
PO X JO

OE "APIS CONSTRUCTION" L41513008A
Tirane Njesia Bashkiake Nr.4 Kodi Zip 1007 , Rruga Aleksander Moisiu , Ndertesa 117, Zona kadastrale Nr.8130

Tipi i Kontratës: Klasike
Procedura e prokurimit/lotit: E Hapur - Shërbime – mbi kufirin e lartë monetar- Prokurim me mjete elektronike

Numri i procedurës / referenca e Lotit: REF-62699-09-25-2025

Përshkrimi i shkurtër i kontratës: "Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Qukës - Qafe Plloçë" me fond limit: 31.819,342 (tridhjetë e një milion e tetëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e treqind e dyzet e dy) Lekë, pa TVSH

Në Euro 328,406.87 (treqind e njëzet e tetë mijë e katërqind e gjashtë presje tetëdhjetë e shtatë) Euro pa TVSH.

Kohëzgjatja e kontratës/marrëveshjes kuadër ose afati për zbatimin e saj: 12 muaj

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në SPE: 26.09.2025

Data e Publikimit të Njoftimit të Kontratës në Buletinin e Njoftimeve Publike: Nr. 55 datë 29 Shtator 2025

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

A) Oferta ekonomikisht më e favorshme, bazuar në kosto X

Sipas rëndësisë:

- Çmimi pikët [0 - 60]
- Përvoja në shërbime të ngjashme pikët [0 - 20]
- Cilësia pikët [0 - 15]
- Propozimet për uljen e ndikimit në mjedis dhe ndikimin social pikët [0 - 5]

oferta ekonomikisht më e favorshme bazuar në çmim

Me anë të këtij Njoftimi ju informojmë se, në këtë procedurë kanë marrë pjesë Ofertuesit e mëposhtëm me këto vlera përkatëse të ofruara:

1. OE "REJ"

J93711608Q

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Këshilli i Ministrave Tel.+ 355 4 22 77 510

<https://www.app.gov.al> 212/1030

Buletini Nr. 73 datë 25 Nëntor 2025

Agjencia e Prokurimit Publik


Vlera: 24,334,300.00 (njëzet e katër milion e treqind e tridhjetë e katër mijë e treqind) Lekë pa TVSH.

Totali i pikëve të marra: 0

OE/BOE me nënkontraktor


Barrierat e sigurisë prej betoni përbëhen nga beton i armuar dhe ndahen në dy tipe:

Barrierat e sigurisë prej betoni me një faqe. BBS me lartësi 81 cm ofrohet për mbajtjen/rikthimin e automjeteve nga njëra anë. Kur barriera ka lartësi 115 cm bëhet për mbajtjen/rikthimin e automjeteve të rënda nga njëra anë.

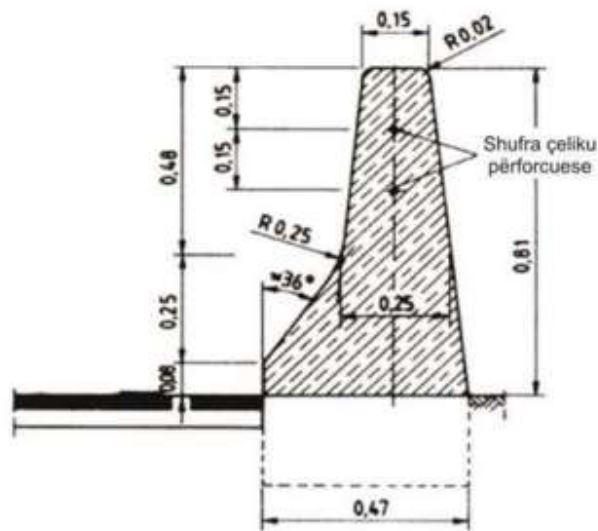

Barriera sigurie prej betoni me një faqe BBS

Barriera sigurie prej betoni me dy faqe. Këto barrierë me lartësi 81cm, ofrohet për mbajtjen/rikthimin e automjeteve nga të dyja anët. Kur barrierë ka lartësi 115 cm bëhet për mbajtjen/rikthimin e automjeteve të rënda nga të dyja anët.

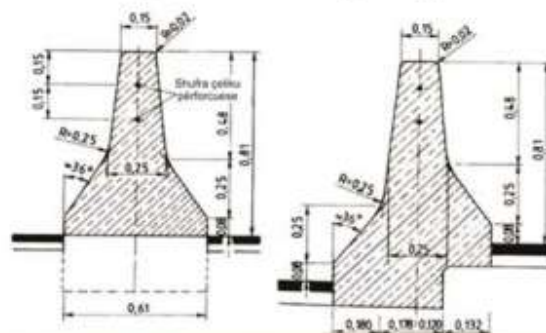

Rezultate permbledhese

Institucion Buxhetor	Perfitues	Dega Thesari	Vlera trasaksioneve	Nr i trasaksioneve	Limiti I vleres	Intervali (sipas date regjistrimi)	Intervali (sipas date ekzekutimi)
All	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	All	72,547,457.00	4	All	=>	=>

Transaksione

*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor	Perfitues	Dega Thesari	Vlera	Data regjistrimit	Data ekzekutimit	Numri fatures	Kategori shpenzime	Pershkrimi fatures
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Pllloce, Segmenti Nr.3" (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	3,807,683	2019-04-18	2019-04-19	3510069342019	Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	1006934-NJMP Qukes- Q Pllloce,Segmenti 3, tvsh ndertimi seksionit rrugor, segmenti 3 , kont vazhdim date 28/10/2015 situacion IPC nr 6 DT 28.02.19, fat nr 32,sr 35881982 dt 31.01.2019
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Pllloce, Segmenti Nr.3" (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	13,706,700	2019-04-18	2019-04-19	3410069342019	Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	1006934-NJMP Qukes- Q Pllloce,Segmenti 3, tvsh ndertimi seksionit rrugor, segmenti 3 , kont vazhdim date 28/10/2015 situacion IPC nr 6 DT 28.02.19, fat nr 34,sr 35881984 dt 28.02.2019
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Pllloce, Segmenti Nr.3" (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	341,240	2019-04-18	2019-04-19	3710069342019	Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	1006934-NJMP Qukes- Q Pllloce,Segmenti 3, tvsh ndertimi seksionit rrugor, segmenti 3 , kont vazhdim date 28/10/2015 situacion IPC nr 6 DT 28.02.19, fat nr 39,sr 35881989 dt 17.04.2019
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Pllloce, Segmenti Nr.3" (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	54,691,834	2019-04-18	2019-04-19	3610069342019	Shpenz. per rritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	1006934-NJMP Qukes- Q Pllloce,Segmenti 3, tvsh ndertimi seksionit rrugor, segmenti 3 , kont vazhdim date 28/10/2015 situacion IPC nr 6 DT 28.02.19, fat nr 38,sr 35881988 dt 17.04.2019

Institucioni Buxhetor	Perfitues	Dega Thesari	Vlera transaksioneve	Numri transaksioneve	Lloji i vleres	Shprehja (sipas date regjistrimit)	Shprehja (sipas date ekzekutimit)
All	RAWAFED AL TOROK SHQIPERI	All	180,000,000.00	5	All	=>	=>

Transaksione

*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor	Perfitues	Dega Thesari	Vlera	Data regjistrimit	Data ekzekutimit	Numri fatures	Kategori shpenzime	Pershkrimi fatures
Njësia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Plloce, Segmenti Nr.3" (3535)	RAWAFED AL TOROK SHQIPERI	Tirane	30,347,871	2025-08-26	2025-08-28	1910069342025	Shpenz. per ritjen e AQT - konstruksione te rugeve	1006934 NJMPQukes -Q Plloce 2025. Iik tvsh per ft nr 10/2025 dt 22.08.2025, sit nr 21 dt 10.07.2025, kontr ne vazhd dt 28.10.2015, Iik pjesor
Njësia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Plloce, Segmenti Nr.3" (3535)	RAWAFED AL TOROK SHQIPERI	Tirane	35,986,075	2025-08-07	2025-08-08	1610069342025	Shpenz. per ritjen e AQT - konstruksione te rugeve	1006934 NJMPQukes -Q Plloce 2025. Iik tvsh per ft nr 9/2025 dt 15.7.25, kontr ne vazh dt 28.10.15
Njësia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Plloce, Segmenti Nr.3" (3535)	RAWAFED AL TOROK SHQIPERI	Tirane	27,841,616	2025-06-16	2025-06-18	1310069342025	Shpenz. per ritjen e AQT - konstruksione te rugeve	1006934 NJMPQukes -Q Plloce 2025. Iik tvsh per ft nr 4/2025 dt 27.05.2025, sit nr 20 dt 14.05.2025, kontr ne vazhd dt 28.10.2015
Njësia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Plloce, Segmenti Nr.3" (3535)	RAWAFED AL TOROK SHQIPERI	Tirane	22,986,312	2025-05-08	2025-05-13	810069342025	Shpenz. per ritjen e AQT - konstruksione te rugeve	1006934 NJMPQukes -Q Plloce 2025. Iik tvsh per ft nr 03/2025 dt 23.04.2025, nr 1/2025 dt 08.01.2025, sit nr 19 dt 13.03.2025, kontr ne vazhd dt 28.10.2015
Njësia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Plloce, Segmenti Nr.3" (3535)	RAWAFED AL TOROK SHQIPERI	Tirane	62,838,126	2025-03-05	2025-03-06	110069342025	Shpenz. per ritjen e AQT - konstruksione te rugeve	1006934 NJMPQukes -Q Plloce 2025. Iik tvsh per ft nr 12/2024 dt 02.12.2024, nr 1/2025 dt 06.01.2025, nr 2/2025 dt 12.02.2025, sit nr 16,17,18, dt 11.10.2024-16.12.2024, kontr ne vazhd dt 28.10.2015

spending.data.al/sq/treasury/list/year/2015/perf_id/RawafedAL-TorokNd%25C3%25ABrmarrijeKontraktuese-DegaeShqiperise/termi/qukes

Institucion Buxhetor	Perfitues	Dega Thesari	Vlera transaksioneve	Numri transaksioneve	Limi vleres	Intervali (sipas date regjistrimi)	Intervali (sipas date ekzekutimi)
All	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	All	401,741,861.00	24	All	=>	=>

Transaksione

*Te dhenat e ketij sherbimi jane te aksesueshme ne web-in zyrtar "Drejtoria e Pergjithshme e Thesarit"

Institucion Buxhetor	Perfitues	Dega Thesari	Vlera	Data regjistrimit	Data ekzekutimit	Numri fatures	Kategori shpenzime	Pershkrimi fatures
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Ploce, Segmenti Nr.3* (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	19,015,083	2018-09-14	2018-09-17	1810069342018	Shpenz. per mritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	NJMP Qukes Q Ploce loti 3 kont vazhdim date 28.10.2015 situacion nr 5 dt 21.06.2018 fat nr 35881964 dt 31.07.2018
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Ploce, Segmenti Nr.3* (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	47,182,111	2018-09-14	2018-09-17	1710069342018	Shpenz. per mritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	NJMP Qukes Q Ploce loti 3 kont vazhdim date 28.10.2015 situacion nr 5 dt 21.06.2018 fat nr 35881968 dt 31.08.2018
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Ploce, Segmenti Nr.3* (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	13,598,750	2018-09-14	2018-09-17	1410069342018	Shpenz. per mritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	NJMP Qukes Q Ploce loti 3 kont vazhdim date 28.10.2015 situacion nr 5 dt 21.06.2018 fat nr 35881958 dt 30.05.2018
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Ploce, Segmenti Nr.3* (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	7,377,061	2018-09-14	2018-09-17	1510069342018	Shpenz. per mritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	NJMP Qukes Q Ploce loti 3 kont vazhdim date 28.10.2015 situacion nr 5 dt 21.06.2018 fat nr 35881961 dt 29.06.2018
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Ploce, Segmenti Nr.3* (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	1,092,346	2018-09-14	2018-09-17	1810069342018	Shpenz. per mritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	NJMP Qukes Q Ploce loti 3 kont vazhdim date 28.10.2015 situacion nr 5 dt 21.06.2018 fat nr 35881969 dt 03.09.2018
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Ploce, Segmenti Nr.3* (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	16,341,225	2018-04-18	2018-04-19	710069342018	Shpenz. per mritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	NJMP Qukes Q Ploce loti 3 kont vazhdim date 28.10.2015 situacion nr 4 dt 04.12.2017 fat nr 35881951 dt 31.01.2018
Njesia e Manaxhimit te projektit Ndertimi i Seksionit Rrugor Qukes-Qafe Ploce, Segmenti Nr.3* (3535)	Rawafed AL-Torok Ndërmarrje Kontraktuese-Dega e Shqiperise	Tirane	2,437,136	2018-04-18	2018-04-19	610069342018	Shpenz. per mritjen e AQT - konstruksione te rrugeve	NJMP Qukes Q Ploce loti 3 kont vazhdim date 28.10.2015 situacion nr 4 dt 04.12.2017 fat nr 36378249 dt 30.12.2017

Qukes – Qafe Ploce Loti 1, Loti 2

Emri i projektit : "Qukes – Qafe Ploce loti 1"
Sipermarresi I Punimeve: "JV Sintram & Albavia"
Mbikqyresi i punimeve: "CEC" shpk
Projektues : "A.I.C Progetti"
Fillimi I Punimeve: 01.07.2015
Vlera e Punimeve: 38,199,662.84 USD

Emri i projektit : "Qukes – Qafe Ploce loti 2"
Sipermarresi I Punimeve: "Combain Group"
Mbikqyresi i punimeve: "CEC" shpk
Projektues : "A.I.C Progetti"
Fillimi I Punimeve: 01.07.2015
Vlera e Punimeve: 63,098,543.45 USD



Njoftimet e Fundit

VENDE VAKANTE 05/11/2025
Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku së bashku me Drejtorin e Përgjithshë të ARRSH-së Gentian Gjyli inspektojnë në terren mirëmbajtjen estetike
29/10/2025
Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku së bashku me Drejtorin e Përgjithshë të ARRSH-së inspektojnë punimet në autostradën Tiranë-Durrës
29/10/2025
Construction and Maintenance Manager 21/10/2025
Site Engineer 2 21/10/2025



Kerko ...

Inspektim punimesh në aksin Qukës-Qafë Pllaçë

Postuar më 17/07/2025

Në aksin Qukës-Qafë Pllaçë ku tashmë kemi hyrë në një fazë të rëndësishme për finalizimin e të gjithë kësaj vepre të shumëpritur. Synojmë që i gjithë aksi rrugor të hapet për qarkullimin e automjeteve brenda këtij sezoni veror, ndaj në të tri lotet po punohet me intensitet të shtuar, pasi tashmë kanë marrë zgjidhje edhe problematikat e trashëguara nga ky projekt. Një aks i ri që do të lehtësojë lëvizjen dhe rrit sigurinë rrugore.



Njoftimet e Fundit

VENDE VAKANTE 05/11/2025

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku së bashku me Drejtorin e Përgjithshë të ARRSH-së Gentian Gjyli inspektojnë në terren mirëmbajtjen estetike

29/10/2025

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku së bashku me Drejtorin e Përgjithshë të ARRSH-së inspektojnë punimet në autostradën Tiranë-Durrës

29/10/2025

Construction and Maintenance

< Kthehu në faqen kryesore | Kërkim i thjeshtë | Kërkim i avancuar

Objekti i tenderit:
Numri i Referencës:
Fondi limit min:
Kodi CPV:

Objekti i tenderit: "Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Qukës - Gafë Pllaçë"
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | Fituesi: 2 T |
Objekti i tenderit: Furnizim vendosje flamuj për institucionin
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | Fituesi: OMAX G | Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Shpenzime për shërbime operative (Postera, grafika/d
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | Fituesi: OPTIMA | Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Blerje materiale laboratorike të shërbimit publik (Blerje t
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | Fituesi: EKM K | Pezulluar: Jo
Objekti i tenderit: Furnizim vendosje flamuj për institucionin
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | Fituesi: ENEA MASLAVICA | Data e hapjes: 12-11-2025 Ora : 14:00 | Data e mbylljes: 13-11-2025 Ora : 14:00 | Numri i referencës: REF-66596-11-12-2025 | Fondi limit: 249,700.00 Lekë | Anulluar: Jo | Pezulluar: Jo

Dosja e tenderit

- Të dhënat kryesore
- Dokumentat e Njoftimit
- Dokumentat e Tenderit

Objekti i tenderit :	"Mirëmbajtje me performancë e segmentit rrugor Qukës - Gafë Pllaçë"
Autoriteti kontraktues :	Autoriteti Rrugor Shqiptar
Fituesi :	2 T
Rezultati :	29,359,200.00 Lekë
NIPT :	K01731001M
Procedura :	E hapur, mbi kufirin e lartë monetar
Tipi i kontratës :	Shërbime
Numri i referencës :	REF-62899-09-25-2025
Numri i Njoftimit :	CN/31914/11192025
Fondi limit :	31,819,342.00 Lekë
Data e publikimit :	20-11-2025 Ora : 12:49
Data e hapjes :	26-09-2025 Ora : 08:00
Data e mbylljes :	26-10-2025 Ora : 11:00
Pezulluar :	Jo
Kodi CPV :	45233141-9 - Punime për mirëmbajtjen e rrugëve.

Mbyll

Tipi i Procedurës

Data e publikimit max

Kërko

Me shumë Info

Fondi limit: 31,819,342.00 Lekë | Anulluar: Jo | Pezulluar: Jo

Me shumë Info

12-2025 | Fondi limit: 249,700.00 Lekë | Anulluar: Jo |

Me shumë Info

06-11-12-2025 | Fondi limit: 577,666.67 Lekë | Anulluar: Jo |

Me shumë Info

0328-11-16-2025 | Fondi limit: 415,333.33 Lekë | Anulluar: Jo |

Me shumë Info

Njoftimi i lidhjes së kontratës

< Kthehu në faqen kryesore | Kërkim i thjeshtë | **Kërkim i avancuar**

Objekti i tenderit	Autoriteti kontraktues Autoriteti Rrugor Shqiptar		
Numri i Referencës	Fituesi / NIPT	Tipi i Kontratës	Tipi i Procedurës
Fondi limit min	Fondi limit max	Data e publikimit min	Data e publikimit max
Kodi CPV		Pastro	Kërko

Objekti i tenderit: Supervizion punimesh Zgjerimi i superstradës Tirané - Durrës Faza III Më shumë info
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | **Fituesi:** A & E ENGINEERING sh.p.k | **Data e hapjes:** 25-08-2025 Ora : 08:00 | **Data e mbyljes:** 26-09-2025 Ora : 10:30 | **Numri i referencës:** REF-50833-08-22-2025 | **Fondi limit:** 21,382,521.92 Lekë | **Anulluar:** Jo | **Pezulluar:** Jo

Objekti i tenderit: - Loti 9: Mirëmbajtje me Performancë "Rruga Berat – Drobonik– Çorogjaf–K/Gllavë" (36 km) Më shumë info
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | **Fituesi:** | **Data e hapjes:** 10-10-2024 Ora : 08:00 | **Data e mbyljes:** 10-02-2025 Ora : 11:00 | **Numri i referencës:** REF-23442-10-09-2024 | **Fondi limit:** 76,498,741.57 Lekë | **Anulluar:** Jo | **Pezulluar:** Jo

Objekti i tenderit: Loti 2: Mirëmbajtje me performancë "Rruga Hekurudha, Vorë, K/Rr. Nr. 52 - Kalaja Prezë, K/NISH Tulla (Rrashbull) – Manikaj (K/TR, e vjetra), Katër Rrugët – Pjezë, Vorë – Manikaj (e vjetra) ,Rreth. Mali i Robit – Rreth. Hyrje Kavaje(Paralele Djalntas), Më shumë info
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | **Fituesi:** | **Data e hapjes:** 25-06-2024 Ora : 08:00 | **Data e mbyljes:** 11-10-2024 Ora : 11:00 | **Numri i referencës:** REF-10978-06-24-2024 | **Fondi limit:** 170,175,194.39 Lekë | **Anulluar:** Jo | **Pezulluar:** Jo

Objekti i tenderit: Loti 3: Mirëmbajtje me performancë "Tiranë - Linzë- Qafë Priskë, Qafë Priskë-Qafë Mollë, Trau Dajç - Kamp, Kryq. Dajç - Vila Qeventare, Rot. TEG – Ibë, Ura e Farkës - Baldushk - Mustafa Koçaj, Vaqarr - Arbanë –Vishaj", (64.1 km) Më shumë info
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | **Fituesi:** | **Data e hapjes:** 25-06-2024 Ora : 08:00 | **Data e mbyljes:** 27-09-2024 Ora : 11:00 | **Numri i referencës:** REF-10978-06-24-2024 | **Fondi limit:** 202,154,683.34 Lekë | **Anulluar:** Jo | **Pezulluar:** Jo

Objekti i tenderit: Loti 1: Mirëmbajtje me performancë "Laç (degëzimi Patokut) - K/Milot (Laç - Milot), Ura e Drojës (Mamurras) - Laç (degëzimi i Patokut), K/Milot - Ura e Matit (e Trenit) Pllanë, Laç - Patok (Plazh) , Fushë Krujë – Krujë, Krujë (kryq. rr. Varosh) – Sarsall Më shumë info
Autoriteti Kontraktues: Autoriteti Rrugor Shqiptar | **Fituesi:** | **Data e hapjes:** 25-06-2024 Ora : 08:00 | **Data e mbyljes:** 21-11-2024 Ora : 11:00 | **Numri i referencës:** REF-10974-06-24-2024 | **Fondi limit:** 194,184,773.77 Lekë | **Anulluar:** Jo | **Pezulluar:** Jo
